

26. Februar 2026

Liebe Anwohnerinnen und Anwohner,

vielen Dank für Ihr anhaltendes Interesse an unserem Projekt und Ihre Anmeldung zum Baunewsletter.


Der Frühling macht sich langsam bemerkbar – und damit rückt auch bei unserem Bauprojekt der Endspurt für die letzten Arbeiten näher. In dieser Ausgabe informieren wir Sie über den aktuellen Stand der Bauaktivitäten in der Altstadt Köpenick sowie in den weiteren betroffenen Ortsteilen.

## Ortsteil Altstadt-Köpenick

Die Arbeiten in der Altstadt Köpenick kommen gut voran. In den nächsten Tagen starten die Baumaßnahmen im **4. Bauabschnitt in der Landjägerstraße**, zwischen Alter Markt und Amtsstraße.

Bitte beachten Sie: In diesem Bereich wird eine **Vollsperrung** eingerichtet. Die Landjägerstraße ist dann nur noch **von der Amtsstraße kommend in Richtung Wendenschloßstraße** befahrbar. Die Arbeiten sollen voraussichtlich **Ende März** abgeschlossen sein.

Nachfolgend finden Sie die geplante Verkehrsführung für die Altstadt Köpenick:

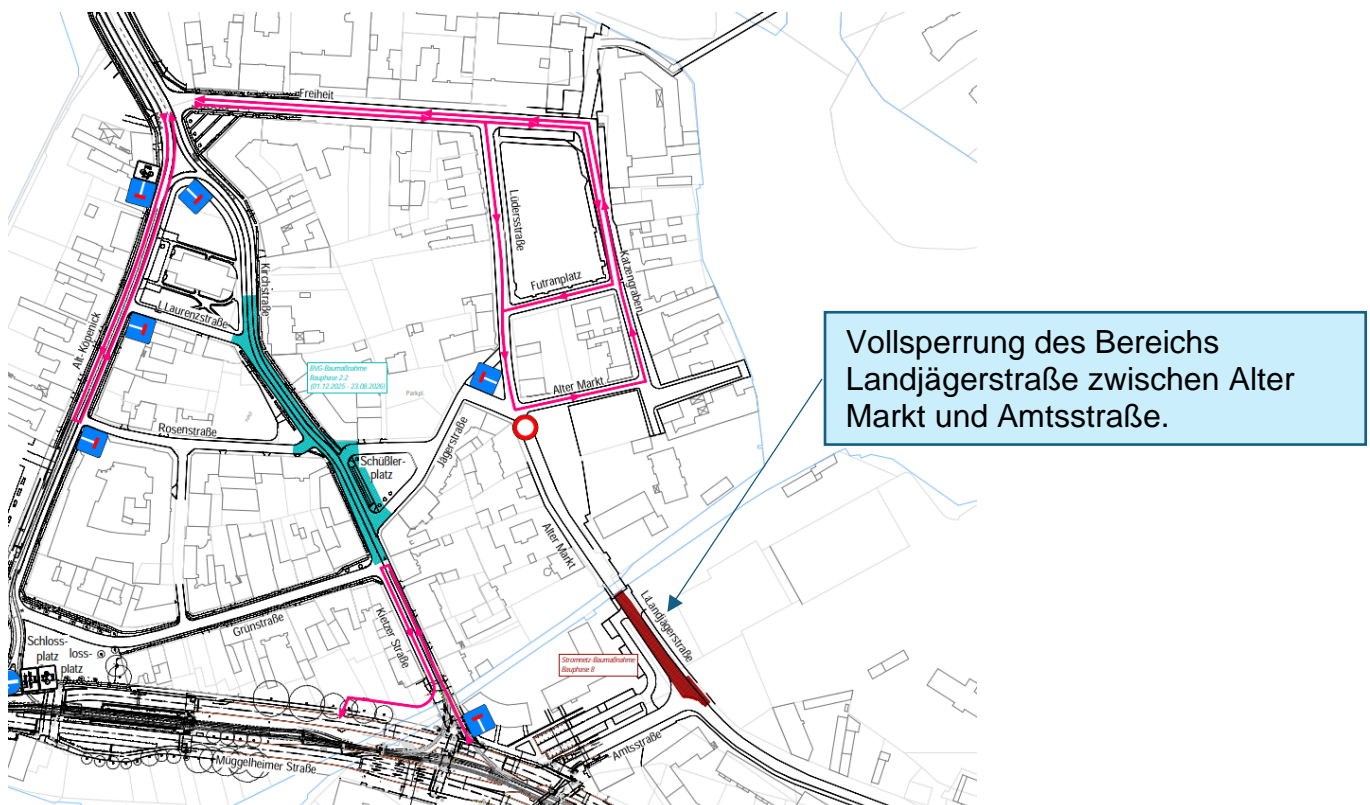

## **Ortsteil Adlershof**

In der Wassermannstraße, Radickestraße, Thomas-Müntzer-Straße sowie Gellertstraße werden derzeit die Kabelzüge vorbereitet. Dafür richtet unsere Tiefbaufirma an mehreren Stellen **Montage- und Ziehgruben** ein, die voraussichtlich bis Mitte des Jahres bestehen bleiben.

Ab dem **9. März** beginnen die Arbeiten zur Kabelquerung **Nipkowstraße/Radickestraße**. Dadurch wird die Buslinie erneut umgeleitet. Die BVG informiert rechtzeitig direkt an der Haltestelle über die genaue Umleitungsstrecke.

## **Ortsteil Spindlersfeld – Aktuelles zur Spülbohrung unter der Dahme**

Nach einer umfassenden Auswertung der bisherigen Spülbohrung beginnt am **2. März** der zweite Bohrversuch. Aktuell laufen die vorbereitenden Maßnahmen.

In der Gutenbergstraße mussten Wasserleitungen kurzfristig abgestellt werden, da diese aufgrund ihres Alters sehr empfindlich sind und Leckagen repariert werden mussten. Wir bitten die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner für diese sehr kurzfristigen Einschränkungen um Entschuldigung.

Wenn alles planmäßig verläuft, können wir den **finalen Rohreinzug Anfang April** durchführen. Auch danach bleibt die Baustelle noch für mehrere Monate bestehen, um unter anderem neue Wasserleitungen und Kabelverbindungen zu verlegen.

## **Danke für Ihre Aufmerksamkeit!**

Herzliche Grüße und bis bald,

Ihr Stromnetz Berlin Team – Bürger\*innendialog

P.S. Sie möchten sich vom Baunewsletter Netzumstrukturierung Treptow-Köpenick abmelden? Dann klicken Sie [hier](#).
